Annexe n°2.4 - Planning simplifié général des travaux de rétablissement du CD 31_Indice B

Voies rétablies	Interface voirie	Ouvrage	Nature des travaux	Exploitation de la voirie		Déviation
				Générale	Ponctuelle	
RD 20 *à Verfeil*	A680 (ASF)		Raccordement à l'A680	Coupure 9 mois		RD 112 - VC 20
RD 77d *à Verfeil*		PI 1028	Elargissement d'un PI pour franchissement de l'A69 au-dessus de la RD 77d	Coupure 6 mois		RD 32 - RD 112 - VC 20
RD 20 *à Verfeil*				Sous circulation		/
RD 20 *à Verfeil*	Route de Puylaurens (VC 20)	PI 1142	Création du demi-diffuseur de Verfeil	Hors circulation	Alternat pour raccord	/
RD 20g *à Verfeil*				Hors circulation	Alternat pour raccord	/
RD 66a *à Teulat/Montcabrier*	RN 126 (DIR-SO), RD 39 (CD 81)	PI 1674	Franchissement de la RN 126 et création de deux giratoires	Coupure 2 mois		Bg St Ber/RN 126: RD 66e - RD 28 /// RN 126/Bg St Ber: RD 28
RD 11 *à Vendine*		PI 2118	Création d'un PI pour franchissement de l'A69 au dessus de la RD 11	Coupure 5,5 mois		RD 826 - RN 126
RD 826 *à Maurens-Scopont*	RN 126 (DIR-SO), RD 35 (CD 81)	PI 2478	Création d'un giratoire à l'intersection RD 826/RN 126	Sous circulation		/

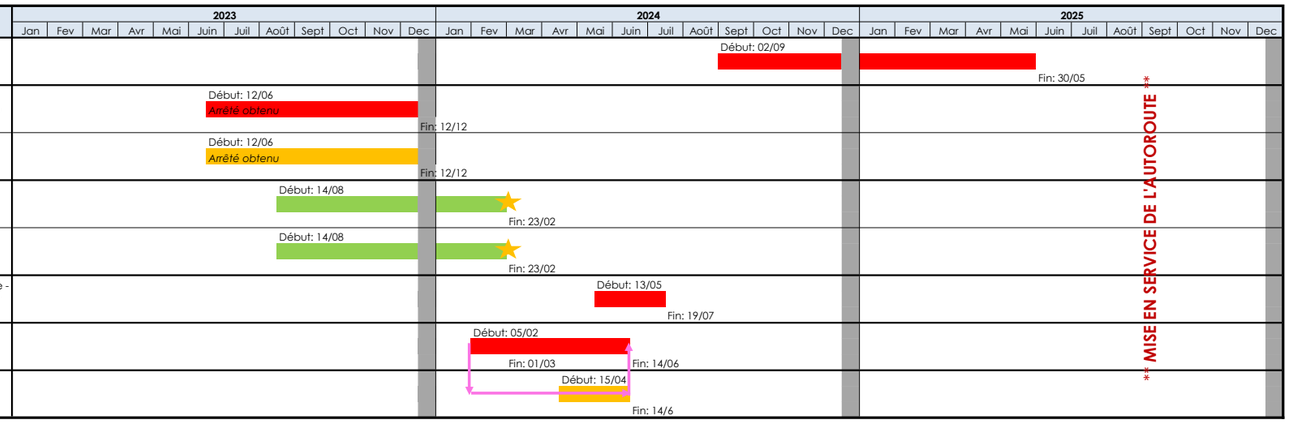

Légende:

- Itinéraire de déviation
- Restriction ponctuelle de circulation
- Coupure ponctuelle
- Circulation maintenue dans des conditions normales
- Circulation maintenue avec restrictions (alternat, nombre de voies réduites, rétrécissement de voies, déviation provisoire...)
- Coupure de voirie avec déviation d'itinéraire
